



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/16-03/2

URBROJ: 2170/1-09/11-16-2

Rijeka, 2. veljače 2016.

- 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**
- 2. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**



Pročelnik

Izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradila:

Biljana Stipetić-Kalinić
Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Člankom 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/5) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Temeljem članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktima Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna. Kako je iznos u Proračunu za 2016. godinu veći, Županijskoj skupštini predlaže se donošenje zaključka o rasporedu sredstava Goranskom sportskom centru.

2. OBRAZLOŽENJE

2.1. Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2015. godinu

Program provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (KLASA:021-04/13-01/3, UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-13-25), (u daljnjem tekstu Program provedbe) usvojen je na 38. sjednici Županijske skupštine održanoj 9. travnja 2013. godine. Izmjene Programa provedbe projekta (KLASA:021-04/14-01/3, UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-14-52) usvojene su na 8. sjednici Županijske skupštine održanoj 27. ožujka 2014. i 3. travnja 2014. godine i na 15. sjednici Županijske skupštine održanoj 26. veljače 2015. godine. Plan aktivnosti za tekuću godinu donosi Župan.

Župan je Zaključkom od 2. ožujka 2015. donio Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak (u daljnjem tekstu RSRTC Platak ili Projekt) u 2015. godini, a Zaključkom od 28. rujna 2015. donio Izmjene Plana s ukupno planiranom vrijednosti investicije od 9.138.750,00 kn u što je uključen, osim sredstava iz županijskog proračuna u iznosu od 5.763.750,00 kn, i iznos za izradu idejnog projekta vodoopskrbe Platka što provodi Vodovod i kanalizacija d.o.o. od 3.375.000,00 kn.

Ukupni plan ostvaren je u iznosu od 7.854.960,00 kn.

Za provedbu aktivnosti na projektu za sadržaje javne turističke infrastrukture nositelj je Goranski sportski centar d.o.o. (u daljnjem tekstu GSC). Ugovor sklopljen s GSC na iznos od 5.500.000,00 kn realiziran je u iznosu od 4.415.647,00 kn, jer se započete aktivnosti ugradnje pokretne trake Baby lift nastavljaju u 2016.

Osim aktivnosti imovinsko-pravne pripreme U Programu provedbe čega je nositelj Upravni odjel regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, tijekom godine je došlo do izmjene plana, te je Upravni odjel postao nositelj aktivnosti projektiranja zone Radeševo i uređenja Bike parka prema uvjetima za dodjelu sredstva od strane Ministarstva turizma. Od strane Ministarstva turizma po provedenom javnom pozivu za dodjelu sredstva iz Fonda za razvoj turizma u 2014. godini Županiji su dodijeljena sredstva za izradu projektne dokumentacije zone Radeševo kao i uređenje Bike parka Radeševo te su s Ministarstvom u 2015. godini potpisana dva ugovora: za projektiranje Akumulacije 2 i sustava za zasnježenje s odobrenim sredstvima od 200.000,00 kn te uređenje Bike parka na Radeševu i odobrenim sredstvima u iznosu od 150.000,00 kn. U 2015. godini od strane Upravnog odjela ugovorena je i dovršena izrada glavnog projekta Akumulacije 2. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

Uz navedene troškove putem neposredne provedbe u Upravnom odjelu vršena je za potrebe imovinsko pravne pripreme izrada geodetskih i parcelacijskih elaborata, za što je utrošeno 39.787,00 kn.

U nastavku se nalazi tablica realizacije financijskog plana s prikazanim grupama poslova i aktivnostima i izvršenim financijskim sredstvima iz županijskog proračuna.

Izvršenje Programa provedbe projekta RSRTC Platak u 2015. iz Proračuna PGŽ

| AKTIVNOST | NOSITELJ AKTIVNOSTI | OPIS AKTIVNOSTI | IZVRŠENJE (kn) |
|---|---------------------|--|------------------|
| IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA | UORRIUP | - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa | 12.500 |
| UREĐENJE ŽIČARA, SKIJAŠKIH STAZA, OBJEKATA TE NABAVA OPREME | GSC | <ul style="list-style-type: none"> - uređenje 4. faze parkirališta - isctavanje igrališta za male sportove i nabava rekvizita - radovi i oprema žičara: Radeševo, Pribeniš, Tešnje i „Baby-lift“ s uslugama nadzora, nabavka vučnih motki te ostali potrebni radovi - Dobava pokretne trake Radeševo - Uređenje skijaških staza - Nabava i uređenje kontejnera za skladište i prodaju karata, izrada nadstrešnica na kontejnerima sanitarija, nabavka opreme za prodaju ski-karata, turistička signalizacija i info-pano, te drugi poslovi i oprema - Nabavka i postavljanje roštilja - Nabavka i postavljanje dječjeg igrališta, snow parka, odbojke na pijesku | 4.235.347 |
| PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | GSC | <ul style="list-style-type: none"> - izrada projekata za povezivanje skijaških staza Tešnje i Pribeniš te Pribeniš 2, te analiza potreba proširenja i uređenja „turističke“ staze i mogućnost povezivanja Tešnja sa „turističkom“ stazom - idejni projekti pratećih objekata gornje i donje stanice žičare Radeševo - idejni projekt staze Radeševo 3 - glavni projekt staze Tešnje - glavni projekt uređenja bike parka | 180.300 |
| IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | UORRIUP | - Glavni projekt Akumulacije 2 | 226.813 |
| SVEUKUPNO | | | 4.654.960 |

Osim sredstava iz Proračuna PGŽ iz Programa „Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak“, putem trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za „Izradu idejne tehničke dokumentacije za dogradnju podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za vodoopskrbu Platka“ utrošeno je još 3.200.000,00 kuna što sufinanciraju Hrvatske vode s 80 %.

2.1.1. Uređenje sadržaja javne turističke infrastrukture

U nastavku se daje izvješće o izvršenju aktivnosti po grupama radova.

2.1.1.1. Rekonstrukcija žičara, uređenje skijaških staza, pokretnih traka i sustava za zasnježenje


Radovi na rekonstrukciji i stavljanju u operativnu funkciju žičara Radeševo, Pribeniš 1 i Tešnje ugovoreni su u dvije faze 2013. i 2014. godine. Nakon tehničkog pregleda obavljenog od strane akreditirane agencije otklonjeni su uočeni nedostaci te su u siječnju 2015. od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture izdana Rješenja za rad za vučnice Pribeniš (Baby lift) i Pribeniš 1 te žičaru Radeševo, a u listopadu 2015. za žičaru Tešnje.

U 2015. izvedeni su građevinski radovi na uređenju gornje i međustanice žičare Radeševo. Dovršena je izgradnja sustava za zasnježenje uz pokretnu traku Radeševo koji omogućuje zasnježenje donjeg dijela skijaške staze Radeševo. Izvršena je nabava pokretne trake Radeševo i započela ugradnja pokretne trake Baby lift.

2.1.1.2. Rekonstrukcija 4. faze parkirališta

Nakon rekonstrukcije 1., 2., i 3. faze parkirališta i ceste, po provedenoj javnoj nabavi i potpisanim ugovorima za rekonstrukciju 4. faze vrijednost radova je iznosila 1.153.148,06 kn. Troškovi nadzora su iznosili 19.500,00 kn.

Na površini 4. faze (plato D) od 5.230 m² dobiveno je 143 novih parkirališnih mjesta za osobne automobile.

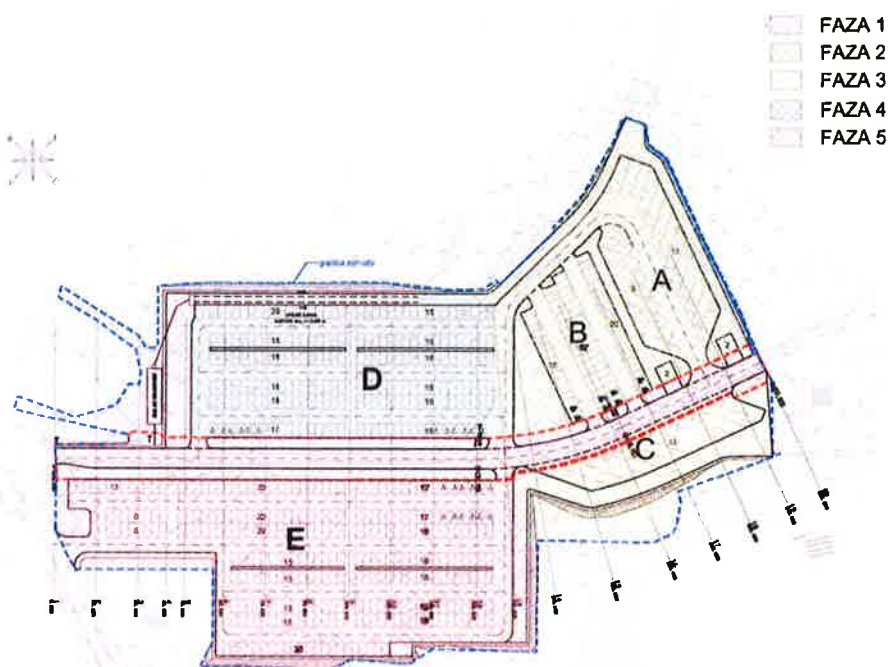

2.1.1.3. Izrada projekata

Od strane GSC-a ugovoreno je i dovršeno sljedeće projektiranje: idejni projekt spoja staze Tešnje i Pribeniš 1, idejni projekt staze Radeševo 3, glavni projekt staze Tešnje, idejni projekt pratećeg objekta uz donju stanicu Radeševo, idejni projekt pratećeg objekta uz gornju stanicu Radeševo, glavni projekt Bike parka.

Od strane Upravnog odjela ugovoren je i izrađen glavni projekt Akumulacije 2 te je predan zahtjev za ishodaenje građevinske dozvole.

2.1.1.4. Razna oprema skijališta i oprema za cjelogodišnje sadržaje

Za redovno funkcioniranje RSRTC Platak dobavljena je razna druga oprema kao što su vatrogasni aparati, računala i printer za ski karte, motorole i razna druga oprema manje vrijednosti. U cilju realizacije planiranih cjelogodišnjih sadržaja provedeni su postupci bagatelne nabave i izvedeni radovi na uređenju još pet platoa za roštiljanje te izgrađeni roštilji, uređeno dječje igralište i zip-line, igralište za odbojku na pijesku, dobavljen kavez za mali nogomet, iscrtana igrališta na dijelu parkirališta i nabavljeni rekviziti. Dobavljeni su portali za napuhavanje i rekviziti za dječji snow park, nabavljeno quad vozilo i freze za čišćenje snijega, izvedeni radovi telekomunikacijske i elektroničke infrastrukture u svrhu pristupa i korištenja interneta, Lan mreže, hot spot i web kamera

Na skijalištu RSRTC Platak do izgradnje planiranih objekata, nabavom kontejnera djelomično su riješene potrebe smještaja pratećih službi i usluga skijališta. U tu svrhu dobavljeni su kontejneri za smještaj HGSS, kontejner za prodaju karata, za skladišni prostor te za sanitarije. U 2015. je nabavljeno još tri kontejnera za potrebe skladišta. Za nesmetano korištenje kontejnera sanitarija na Radeševu izvedeni su potrebni građevinski radovi izgradnje nadstrešnica.



Dječje igralište na Platku

2.1.2. Imovinsko-pravna priprema

Aktivnosti imovinsko-pravne pripreme skijališta Radeševo i ostalog dijela Centra Platak započeli su krajem 2012. godine. Izdana je lokacijska dozvola za zonu Radeševo koji je postala izvršna te su izrađena dva parcelacijska elaborata koja su sredinom 2014. godine provedena u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

Vlada Republike Hrvatske je početkom veljače 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak („Narodne novine“ broj 17/15) prema ishodaenoj lokacijskoj dozvoli za zonu Radeševo.

Sve čestice u zoni Radeševo su u vlasništvu Republike Hrvatske i imaju status šumskog zemljišta. Temeljem izmijenjenog članka 51. Zakona o šumama propisano je da se šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Prostornim planom proglašene građevinskim područjem, izdvajaju iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske danom stupanja na snagu Prostornog plana kojim su uključene u građevinsko područje uz uvjet da je Ministarstvo poljoprivrede na predmetni Prostorni plan dalo prethodno mišljenje. Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13) centar Platak je određen kao građevinsko područje sportske namjene – mješoviti sportski centar (centar za zimske i ljetne sportove) i Ministarstvo poljoprivrede je sudjelovalo u postupku donošenja istoga. Slijedom navedenog, početkom 2015. godine podneseni su zahtjevi Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) podijeljeni prema osnovama uređenja imovinsko-pravnih odnosa: pravo građenja i pravo služnosti.

U 2015. godini nastavljen je intenzivan rad na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na svim nekretninama u sklopu zone Radeševo, a prioritetno vezano za Akumulaciju 2 i sustav za zasnježenje. Jedan od postupaka je dovršen te je dana 18. studenog 2015. između RH i GSC sklopljen Ugovor o pravu služnosti u svrhu izgradnje infrastrukture sustava za zasnježenje. Očekuje se skoro okončanje i ostalih postupaka.

2.1.3. Aktivnosti na rješavanju vodoopskrbe

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Čavle i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu: KD VIK) potpisali su 7. svibnja 2013. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (u daljnjem tekstu: Sporazum). Predmet Sporazuma je izrada idejnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz vodoopskrbnog sustava koji je u nadležnosti KD VIK uključujući izgradnju novih vodosprema Kovačevo i Platak, crpnih stanica i cjevovoda. Planirani rok za izvršenje predmeta Sporazuma je tri godine i ističe u svibnju 2016. godine.

Sukladno Sporazumu izrada idejnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava, koja je procijenjena na 2.700.000,00 kuna (bez PDV-a), obaveza je KD VIK. Izrada idejnih projekata ugovorena je u mjesecu rujnu 2014. godine. Projektiranje idejnih projekata je završeno te su predani zahtjevi za ishođenje lokacijskih dozvola za svih 16 građevina u zoni zahvata dogradnje vodoopskrbnog podsustava područja Grobinštine i gradnje podsustava za transport vode na Platak. Utrošeno je 3.200.000,00 kn u čemu su sudjelovale Hrvatske vode s učešćem od 80 %. U 2016. godini planirana je izrada dijela glavnih projekata i imovinsko-pravna priprema, procijenjene vrijednosti 6.000.000,00 kuna, a za što će biti potrebno pristupiti potpisivanju novog sporazuma.

Sukladno Sporazumu izrada projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenske Akumulacije 2 kao i troškovi izgradnje Akumulacije 2 (koji su procijenjeni na 7.000.000,00 kuna) obaveza je Primorsko-goranske županije. Projektiranje glavnog projekta Akumulacije 2 sufinancira se sredstvima Ministarstva turizma, a istovremeno je sukladno novom javnom pozivu Ministarstva turizma u 2015. godini prijavljen projekt izgradnje Akumulacije 2.

2.2. Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u razdoblju 2013.-2015.

Iz Proračuna PGŽ je za provedbu projekta od 2013. do 2015. godine kroz Program utrošeno ukupno 19.146.000,00 kn. Također su putem ŽUC-a, sredstvima HC-a, izvedeni radovi na proširenju 2,2 km ceste do Platka u vrijednosti 5.831.856,00 kn.

Kao posebno važni realizirani dijelovi investicije u Centar Platak (nakon više od 20 godina) mogu se istaknuti:

- Izvedeni su radovi na uređenju 300 m prometnice na parkiralištu Platak (1. faza),
- Dovođeni radovi rekonstrukcije - 2., i 3. faza uređenja parkirališta sa sustavom oborinske odvodnje i javnom rasvjetom, s ukupno 73 parkirna mjesta za osobne automobile i 27 autobusa
- U 2015. dovršetkom 4. faze rekonstrukcije parkirališta uređena 143 nova parkirna mjesta,
- Dograđen je postojeći sustav zasnježenja uz pokretnu traku Radeševo
- Izvršene su sanacije i stavljene u funkciju žičare (Pribeniš, Pribeniš 1, Radeševo i Tešnje)
- Uređene skijaške staze Radeševo 1 i 2, biciklističke i pješačke staze, nova rasvjeta na skijalištu, nabavljena ostala potrebna oprema za funkcioniranje skijališta
- Putem ŽUC-a izvedeni su radovi na rekonstrukciji 2,2 km ceste do Platka u vrijednosti i sanacija usjeka i zavoja u dužini 500 m
- Dobivene su dozvole za rad žičare Radeševo, Pribeniš 1, Pribeniš i Tešnje
- U 2015. dobavljena pokretna traka Radeševo
- Uređeni i nabavljeni kontejneri za GSC, skladišta, GSS, prodaju karata i sanitarni čvor (oblaganje, izrada krovova, nadstrešnice), nabavljena oprema za prodaju ski-karata, turistička signalizacija i info-pano, te druga oprema
- Nabavljeno quad vozilo
- Uređene zone i postavljeno prvo 5 roštilja, u 2015. godini dodatnih 5 roštilja
- Uređena dječja igrališta i odbojka na pijesku
- Uređen dio parkirališta sa igralištem za male sportove
- Izvedeni radovi telekomunikacijske i elektroničke infrastrukture u svrhu pristupa i korištenja interneta, Lan mreže, hot spot i web kamera
- Započela postava pokretne trake Baby lift dužine 200 m

Kroz realizaciju županijskog programa započela je revitalizacija cijelog područja Platka te je osim već nabrojanih izvršenih aktivnosti na obnovi, dogradnji i dopuni sadržaja i objekata javne turističke infrastrukture došlo do promjene najmoprimaca domova na Platku i caffè bara. Obnovljen je Veliki dom u ugostiteljskom dijelu s planovima za daljnju obnovu kao i postavljena rotonda - caffè bar na dnu staze Radeševo na zadovoljstvo velikog broja posjetitelja.

Programske aktivnosti provedene kroz trogodišnje ulaganje smjestile su Platak na poziciju sportsko rekreacijskog centra s nizom sadržaja koji su na raspolaganju za korisnike tijekom cijele godine. Sve veće korištenje sadržaja i sve veća zainteresiranost velikog broja korisnika, kao i zainteresiranost za ulaganja od drugih investitora, opravdala su dosadašnje napore i ulaganja Županije u obnovu i dopunu turističkih, sportskih i rekreacijskih sadržaja, te se aktivnosti na projektu nastavljaju dalje.


2.3. Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko, rekreacijski i turistički centar Platak

U Proračunu PGŽ je za projekt u 2016. godini planirano 6.389.000,00 kuna. Prijedlog aktivnosti za 2016. godinu raspravljen je i usvojen na sastanku Projektnog tima održanom 2. veljače 2016. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Odjel vrši aktivnosti projektiranja i uređenja objekata u iznosu od 389.000,00 kn. Predlaže se dodjela sredstava Županijskoj upravi za ceste za rekonstrukciju dionice ceste do Platka u iznosu od 2.000.000,00 kn i GSC-u za ostale aktivnosti na sadržajima javne turističke infrastrukture u iznosu od 4.000.000,00 kn.

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- izraditi glavni projekt sustava zasnježenja skijališta Radeševo
- izraditi dio glavne projektne dokumentacije za izgradnju skijaških staza, žičara, prometnice i ostalih objekata prema dinamici iz godišnjih planova
- pokrenuti postupak izrade glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava
- ishoditi građevinske dozvole za Akumulaciju 2 u podnožju Radeševa volumena 44.000 m³ i sustav za zasnježenje
- graditi sustav za zasnježenje s akumulacijama u fazama
- postaviti pokretnu traku uz sanjkalište Pribeniš dužine 100 m
- dovršiti imovinsko pravnu pripremu skijališta Radeševo s DUUDI
- rekonstruirati sljedeću dionicu prometnice do Platka dužine 1,3 km putem ŽUC-a
- urediti Bike park u široj zoni Radeševa s dvije nove staze: laganijom Flow dužine 2019 m i zahtjevnijom Downhill dužine 1474 m
- dopuniti ponudu „ljetnim sadržajima“: dječjeg igrališta, adrenalinskog parka, uređenjem prostora za boravak u prirodi i školu u prirodi, produžiti i urediti postojeće pješačke i biciklističke staze,
- urediti i međusobno povezati postojeće skijaške staze (turističku, Pribeniš, Tešnje), urediti staze za sanjkanje, nordijsko trčanje, snow-bord, pokretne trake-sanjkališta, tubing
- izraditi Izmjenu Urbanističkog plana uređenja SC Platak, posebice u dijelu izmjene uvjeta izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta (za što do sada zbog uvjeta izgradnje velikog hotelskog kompleksa s 2000 ležajeva nije iskazan interes od strane drugih ulagača), sportskih igrališta i dijela infrastrukture

Pregledna karta skijaških zona u sklopu RSRTC Platak

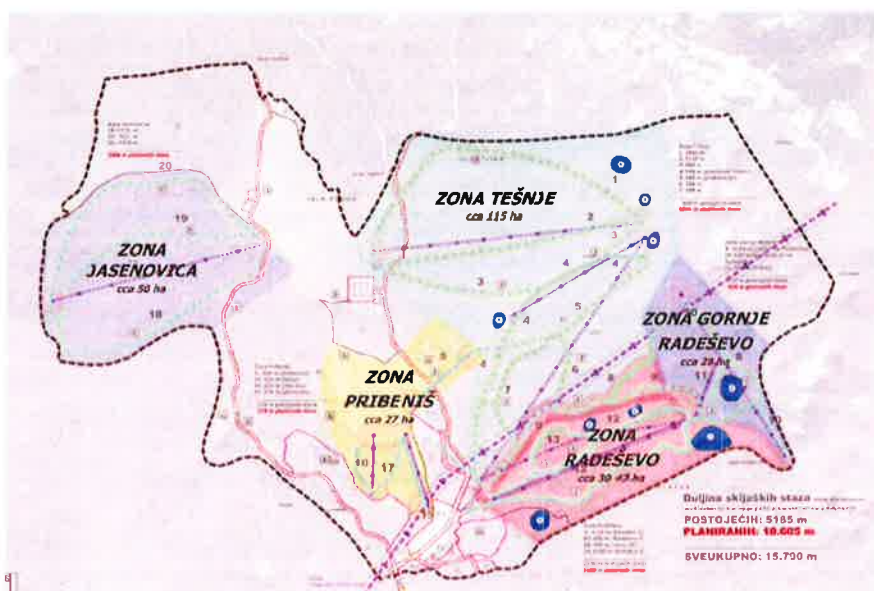

U sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se nastavak realizacije dijela sadržaja Centra Platak koju bi financirala PGŽ i ostale zainteresirane strane u projektu.

Nastavit će se aktivnosti na pripremi dokumentacije, ali i dopune i poboljšanja postojećih objekata odnosno sadržaja. Prioritetni zadatak je i dovršiti imovinsko-pravne poslove kako bi se stekli uvjeti za građenje te staviti u funkciju sustav za zasnježenje.

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu («Službene novine» broj 34/15), sredstva za projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktima Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna. Kako je iznos u Proračunu za 2016. godinu veći, Županijskoj skupštini predlaže se donošenje zaključka o rasporedu sredstava Goranskom sportskom centru i Županijskoj upravi za ceste.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvća se Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak i prosjeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje i usvajanje.
2. Predlaže se Županijskoj skupštini da izvrši raspored novčanih sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 9-Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna, korisnicima kako slijedi:
 - Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice u iznosu od 4.000.000,00 kuna za realizaciju aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 - Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2.000.000,00 kuna za rekonstrukciju dionice ceste Ž 5030

Zona roštilja



Žičara Radeševo



Maškarani Platak



Veliki dom



Rotonda i pokretna traka na dnu Radeševa



Noćno skijanje

