



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/19-03/1

URBROJ: 2170/1-09/11-19-33

Rijeka, 23. travnja 2019.

- 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2018. GODINU**
- 2. PRIJEDLOG PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2019. GODINU**



**Pročelnik**

**prof.dr.sc. Ljudevit Krpan**

Voditeljica Projektnog tima za  
operativnu provedbu projekta RSRTC  
Platak

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.

## 1. PRAVNI OSNOV

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 25. Stavak 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

### 2.1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR (RSRTC) PLATAK ZA 2018. GODINU



Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Županijska skupština je na sjednici od 21. prosinca 2017. donijela Odluku o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak koja se odnosi na razdoblje od 2018.-2020. godine. Na sjednici od 27. rujna 2018. Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak. Odlukom su utvrđeni iznosi financiranja po godinama. Nositelj provedbe aktivnosti iz navedene Odluke je Goranski sportski centar (GSC) d.o.o.

Planirani iznos sredstava za 2018. godinu iznosio je 3.000.000,00 kn te su u istom iznosu planirane i aktivnosti GSC-a u Planu aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2018. godinu.

Dana 23. travnja 2018. Župan je donio Zaključak o donošenju Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2018. godini, a 3. prosinca 2018. Zaključak o donošenju Izmjena Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u 2018. godini.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2018. godinu planiran je s ukupnom vrijednošću investicije od 5.812.500,00 kn u što je bio uključen, osim već navedenog iznosa sredstava od 3.000.000,00 kn iz županijskog proračuna u provedbi GSC-a, i iznos za izradu glavnih projekata vodoopskrbe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VIK) u iznosu od 1.000.000,00 kn i sredstva Županijske uprave za ceste (ŽUC) koja provodi aktivnost uređenja ceste Ž 5030 u iznosu od 1.800.000,00 kn. Iz Županijskog proračuna su još planirana sredstva u iznosu od 12.500,00 kn za imovinsko pravnu pripremu zone Radeševo.

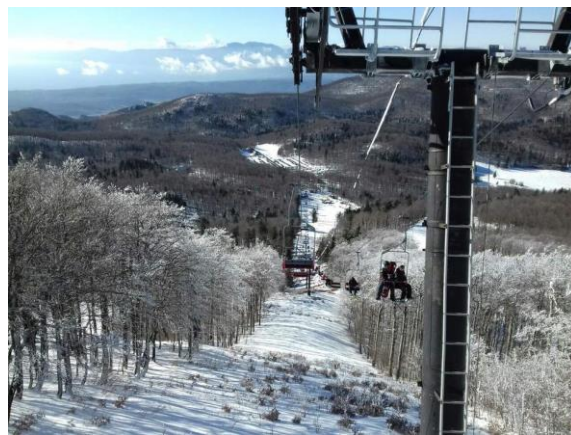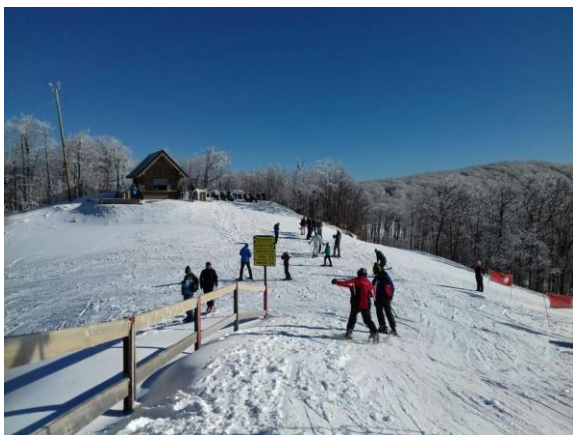

Vrha Radeševa 21.1.2018.

Ukupni Plan realiziran je u iznosu od 6.377.111,00 kn odnosno 109,71 % , od čega iz Županijskog proračuna 2.934.713,00 kn odnosno 97,42 %.

U 2018. godini prvenstveno su se vršile aktivnosti na pripremi projekta izgradnje sustava za zasnježenje uključujući novu akumulaciju. Planiran je početak gradnje prve dvije faze sustava za zasnježenje što uključuje Akumulaciju 2, crpnu stanicu i cjevovode staze Radeševo 1.

Dana 17.5.2018. potpisan je između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o. Okvirni sporazum o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak za razdoblje od 2018.-2020. godine i Ugovor o financiranju aktivnosti u provedbi projekta za 2018. godinu. Dana 31.10.2018. potpisan je Dodatak 1. Okvirnom sporazumu, a 10.12.2018. Dodatak 1. Ugovoru o financiranju aktivnosti.

U ožujku 2018. direktor GSC-a donio je Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavu radova na izgradnji sustava za zasnježenje na području RSRTC Platak koji uključuje akumulaciju 2, pumpanicu, cjevovode sustava zasnježenja skijaških staza Radeševo i skijaških staza Baby lift i Pribeniš kao i topove za zasnježenje. Pripremljena je dokumentacija za nadmetanje i proveden postupak javne nabave. Kako su dostavljene ponude bile veće od osiguranih sredstava donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave pa je proveden novi postupak nabave u razdoblju od 7.8.2018. do 29.8.2018. kada je izvršeno otvaranje ponuda. Po izvršenoj analizi i ocjeni ponuda donesena je od strane direktora GSC-a Odluka o odabiru te je s najpovoljnijim ponudračem 12.11.2018. sklopljen Okvirni sporazum za razdoblje 2018.-2020. i koji se odnosi na sve planirane faze sustava za zasnježenje, a kroz ukupno pet cjelina odnosno ugovora te Ugovor za javnu nabavu radova za 1. cjelinu sustava za zasnježenje koja se odnosi na dvije faze sustava odnosno akumulaciju-retenciju, pumpanicu, trafostanicu, pripadajuće objekte i cjevovode i cjevovode skijaške staze Radeševo 1.

Ugovorene su i sve potrebne usluge nadzora i savjetovanja.

Dana 21.5.2018. Goranski sportski centar d.o.o. i Ministarstvo državne imovine potpisali su Ugovor o osnivanju prava građenja za zemljišta u vlasništvu RH za izgradnju akumulacija, čime su se stekli svi zakonski uvjeti za početak građenja.

Radovi su započeli u prosincu 2018. te su izvršeni radovi sječe šume i izrade dijela izvedbenih projekta.



Radovi na 1. cjelini sustava za zasnježenje - na području akumulacije i crpne stanice (pumpaone)

Prema planu koji se odnosio na dio uređenja novih ljetnih ili cjelogodišnjih sadržaja dovršeni su svi prethodni građevinski radovi na uređenju trim staze i pripremljeni platoi za šest radnih mjesta/stanica za vježbanje. Proveden je postupak javne nabave za opremu. Sklopljen je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem te je postavljena oprema na šest stanica za vježbanje.

Provedena je nabava za radove na izgradnji četverostaznog bočališta te je sklopljen ugovor. U listopadu 2018. godine su započeli pripremni i zemljani radovi, ali su zbog vremenskih uvjeta isti zaustavljeni. Dovršetak se očekuje početkom svibnja 2019. godine.



Radovi na izgradnji četverostaznog bočališta

Dovršene su izrade idejnih rješenja za parkiralište Pb preko puta Šumarije, prostorno tehnička analiza korištenja stare prometnice, elaborata za zaštitu od štetnog djelovanja voda za potrebe izgradnje akumulacije-retencije, idejnog projekta uređenja okoliša akumulacije, započela je izrada projekta izgradnje garaža, spremišta i uprave GSC-a te uređenja skijaške staze Radeševo 2 sa sabirnim kanalima za potrebe punjenja akumulacije.

Nabavljen je ratrak i traktor za potrebe rada GSC-a u RSRTC Platak.

Od strane ViK-a dovršena je izrada još šest glavnih projekta za objekte vodoopskrbe podsustava Grobnik-Platak.

Od strane ŽUC-a kao nositelja aktivnosti realizirana je aktivnost uređenja još jedne dionice županijske ceste do Platka. Pripremljeni su projektni zadatak i natječajna dokumentacija za postupak javne nabave za radove sanacije ceste ŽC 5030, III2 faza. Provedena je javna nabava, donesena je Odluka o odabiru ponuditelja te su ugovoreni radovi na uređenju dionice dužine 850 m. Dovršeni su svi ugovoreni radovi.

Izješće za 2018. godinu u tabličnom prikazu nalazi se u prilogu.

## **2.2. PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2019. GODINU**

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, planiraju se sredstva za provedbu aktivnosti predmetnog projekta.

Za daljnje unapređenje zimske sezone preduvjet je izgradnja sustava za zasnježenje čime bi se povećao broj snježnih dana, a time i korisnika, te se u razdoblju od 2018.-2020. godine, kako je navedeno, planirane aktivnosti odnose u najvećem dijelu na uređenje nove javne turističke infrastrukture i to sustava za zasnježenje, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te uređenje postojećih i novih sadržaja u suradnji s drugim ustanovama, kao što je npr. meteorološka postaja ili informativne točke i edukativne šetnice.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2019. godinu planiran je s ukupnom vrijednošću investicije u tekućoj godini od 13.807.000,00 kn u što je uključen, osim sredstava iz županijskog proračuna, i iznos za dovršenje izrade glavnih projekata vodoopskrbe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VIK) u iznosu od 1.800.000,00 kn. Iz Županijskog proračuna, osim sredstava od 12.000.000,00 kn u usvojenom Proračunu za 2019. još su planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, koja će se osigurati izmjenama i dopunama Proračuna za o.g., a koja su rezervirana po ugovoru za imovinsko pravnu pripremu zemljišta zone Radeševo.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2019. godinu prethodno je raspravljen i usvojen na sastanku Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak 8. ožujka 2019. kao i na sjednici Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak od 18. travnja 2019.

Navodimo najvažnije planirane aktivnosti:

- dovršiti gradnju sustava za zasnježenje i to ugovorene 1. cjeline te nabaviti dio opreme – topova za zasnježenje iz 5. cjeline
- ishoditi građevinske dozvole za sustav zasnježenja staza Baby lift i Pribeniš i dovršiti imovinsko-pravnu pripremu za dvije čestice u vlasništvu RH
- dovršiti izradu glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava
- dopuniti ponudu ljetnim i cjelogodišnjim sadržajima – dovršiti izgradnju bočališta i ovisno o vremenskim uvjetima, po dovršenju izgradnje akumulacije urediti okoliš i opremiti igralima i klupama

- provesti ostale potrebne poslove izrade dokumentacije, nabave usluga, opreme, vozila i radova vezane uz uređenje, korištenje i upravljanje sadržajima unutar RSRTC Platak.

Posebno će se vršiti i priprema za rekonstrukciju žičare Radeševo koja je sljedeća veća investicija u okviru projekta RSRTC Platak, u smislu izrade prethodnih analiza i pripreme natječajne dokumentacije za projektiranje i radove.

Dovršenje izgradnje svih faza sustava za zasnježenje planirano je u 2020. i najveći dio sredstava planiran je u tu svrhu. Tijekom ove godine pripremit će se odnosno ažurirati plan u dijelu uređenja ostalih sadržaja prvenstveno zbog mogućih potreba za dodatnim sredstvima.

Županijska uprava za ceste planira uvrstiti u I izmjene Plana za ovu godinu rekonstrukciju sljedeće dionice prometnice Ž 5030, što će se naknadno uvrstiti u plan ovog projekta .


Potrebno je napomenuti da su u projekt uključeni mnogi dionici. Za potrebe projekta RSRTC Platak surađivali smo s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ) koji su izradili Meteorološku podlogu za područje Plataka. Pri suradnji preporučili smo izgradnju meteorološke stanice što je i prihvaćeno.

DHMZ sada provodi projekt Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH - METMONIC za preko 100 postaja, a u projekt i to u prvu grupu lokacija, je uključena i lokacija na Platku. Postava Meteorološke (MP) postaje Platak planirana je na čestici u vlasništvu Republike Hrvatske preko puta zgrade Šumarije. Potpisan je Sporazum o suradnji s Općinom Čavle, a od Ministarstva državne imovine je dobivena suglasnost. DHMZ će provesti nekoliko nabava: za konzultante za izradu tendera, za projektiranje te za radove i ukoliko se postupci provedu u planiranoj dinamici, moguć je početak radova na jesen ove godine.

U tijeku je i projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ koji se sufinancira sredstvima EU fonda i uključuje interpretacijsku točku Platak. Plan aktivnosti na navedenom projektu vezan je za samostalne interpretacijske točke smještene u različitim jedinicama lokalne samouprave, tako i na lokaciji Platak. U sklopu projekta izradit će se krovni Interpretacijski plan koji će odrediti teme iz područja prirodnih osobitosti, zaštite prirode, suživota čovjeka i prirode te lokalne turističke ponude te paralelno i Planovi upravljanja posjetiteljima za sva odredišta prirodne baštine i koji će dati smjernice o preporučenoj (ili dozvoljenoj) brojnosti posjetitelja u pojedinim dijelovima godine, eventualnu zonaciju i slično, između ostalog i za interpretacijsku točku na Platku. Izradit će se i Strategija komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta. Također, u prvom dijelu 2019. godine planira se na odredišta prirodne baštine postaviti sustav za bilježenje i praćenje brojnosti posjetitelja kako bi se prikupili točni podaci i ustanovio razvoj projektnih aktivnosti. Nabava samostalnih interpretacijskih točaka koje će se na lokacijama postaviti u dogovoru s vlasnicima, odnosno upraviteljima, planirana je tijekom 2020. godine.

Prijedlog Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2019. godini s aktivnostima, nositeljima, iznosima i dinamikom realizacije odnosno indikativnim rokovima nalazi se u prilogu.

## Pregledna situacija svih cjelina sustava za zasnježenje

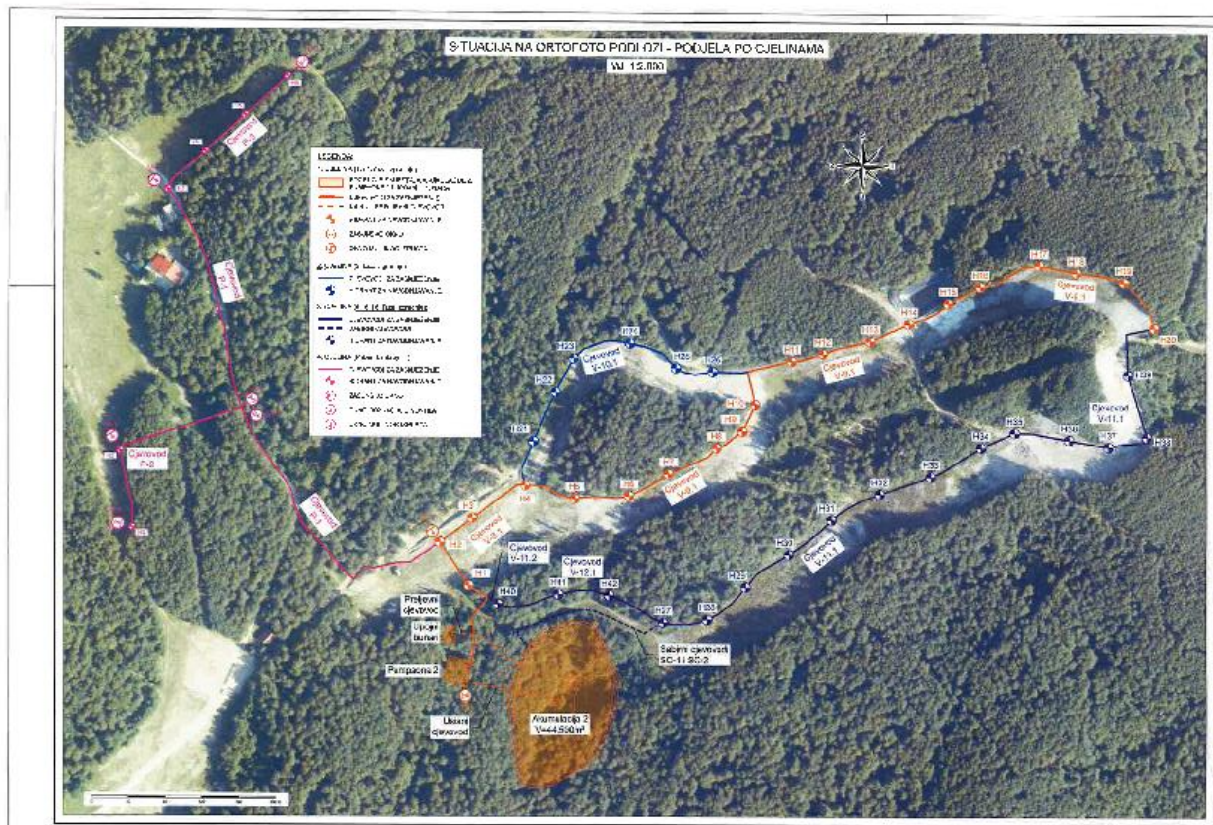

### 3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Sredstva Primorsko-goranske županije za provedbu projekta planiraju se u Proračunu Primorsko goranske županije za 2019. godinu u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

### 4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donio je

### Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2018. godinu.
2. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2019. godinu.

(Plan aktivnosti je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donio je

## **Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2019. godini**

### **I.**

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2019. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbe i praćenja provedbe projektnih aktivnosti,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi aktivnosti pripreme, izrade dokumentacije, uređenja, opremanja i gradnje sadržaja javne sportsko rekreacijske i turističke infrastrukture,

Općina Čavle u dijelu imovinsko pravne pripreme, provedbe i praćenja provedbe projektnih aktivnosti, uređenja i opremanja sadržaja,

te

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.

### **II.**

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2019. godini, usvojen od strane Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti navedene u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

### **III.**

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.



**TABLICA – PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2019. GODINI**

| <b>CJELINA</b>                   | <b>NOSITELJ AKTIVNOSTI</b> | <b>AKTIVNOSTI</b>  | <b>ROK</b>  | <b>PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR</b> |
|----------------------------------|----------------------------|--|-------------|--|
| <b>VODOOPSKRBA</b>               | ViK                        | - izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.   | 31.12.2019. | 1.800.000<br>(VIK)                       |
| <b>IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA</b> | UO RRIUP/<br>Općina Čavle  | - dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo  | 31.12.2019. | 7.000<br>(PGŽ)                           |
|                                  | GSC                        | - priprema, razrada i uvođenje elektronskih karata na žičarama   | 15.11.2019. | 12.000.000<br>(PGŽ)                      |
|                                  | GSC/<br>Općina Čavle       | - priprema rekonstrukcije žičare Radeševo (analize, projekti, geodetski elaborati i dr.)   | 31.12.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza   | 15.12.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - priprema i izgradnja sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš<br>- nadzor   | 15.12.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - ishođenje dozvola i radovi za dovod tehničke vode od akumulacije do sanitarnih čvorova i domova  | 15.12.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - izgradnja četverostaznog bočališta   | 30.09.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - komunalno opremanje, NN mreža, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.   | 31.10.2019. |  |
|                                  | GSC                        | - priprema, nabava, uređenje i postavljanje "ljetnih" sportsko rekreacijskih sadržaja i infrastrukture kao što su: uređenje tematskih parkova, okoliša, igrališta, staza, roštilja i dr. | 30.09.2019. |  |

| CJELINA                        | NOSITELJ<br>AKTIVNOSTI | AKTIVNOSTI  | ROK         | PROCJENA<br>VRIJEDNOSTI<br>(kn) I IZVOR |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------|---|
|                                | GSC                    | - uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak   | 31.10.2019. |   |
|                                | GSC                    | - nabava ostalih usluga i izrade potrebne dokumentacije (tehnička savjetovanja, izrada koncepcija, idejnih rješenja, projekata, analiza, stručnih podloga, geodetskih podloga, programa, vizualizacija, tiskanje, objave, natječaji, usluge odvjetnika i dr.) | 31.12.2019. |   |
| <b>UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ</b> |                        |   |             | <b>12.007.000</b>                       |
| <b>SVEUKUPNO</b>               |                        |   |             | <b>13.807.000</b>                       |

Napomene:

- po Ugovoru iz 2018. godine između Županije i GCS-a od ukupno ugovorenih 3.000.000,00 kn preostala je nerealiziranih sredstava u iznosu od 70.787 kn. Ista nisu uvrštena u ovaj Plan te će se po potrebi naknadno uvrstiti u Plan za ovu ili iduću godinu te u Proračun PGŽ (svaka promjena godišnjih iznosa iziskuje promjenu Odluke o financiranju donesene od strane Skupštine PGŽ)
- po Ugovoru između Županije i odvjetničkog društva za imovinsko pravnu pripremu preostala su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn koja će se uvrstiti u I Izmjene Proračuna PGŽ za 2019. i navedena su u ovom Planu projekta



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za regionalni razvoj,**  
**infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/18-03/1

URBROJ: 2170/1-09/11-18-119

Rijeka, 31.1.2019.

**PLAN PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2018. GODINI**  
**- Izvješće o izvršenju do 31.12.2018.**

| <b>CJELINA</b>                        | <b>NOSITELJ<br/>AKTIVNOSTI</b> | <b>AKTIVNOSTI</b>  | <b>ROK</b>  | <b>PLAN</b>        | <b>IZVRŠENO</b> | <b>STANJE AKTIVNOSTI</b>  |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------|---|
| <b>VODOOPSKRBA</b>                    | ViK                            | - izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava. | 31.12.2018. | 1.000.000<br>(VIK) | 1.556.250       | - nastavljeno je projektiranje, od strane Hrvatskih voda sufinancirano 1.245.000 kn<br>- dovršeni glavni projekti cjevovoda CS Kamenjak-CS Platak, CS Platak, V. Platak |
| <b>IMOVINSKO-<br/>PRAVNA PRIPREMA</b> | UO<br>RRIUP                    | - dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo                      | 31.12.2018. | 12.500<br>(PGŽ)    | 5.500           | - potpisan Ugovor o pravu građenja za akumulacije 21.5.2018., preostalo je dovršenje postupaka za skijaške staze Radeševo   |
| <b>UREĐENJE CESTE<br/>Ž 5030</b>      | ŽUC                            | - uređenje dionice ceste Ž 5030 IIIb faza  | 15.12.2018. | 1.800.000<br>(ŽUC) | 1.886.148       | - provedena javna nabava, ugovoreni radovi za uređenje dionice od 850 m, dovršeni svi radovi  |

| CJELINA  | NOSITELJ AKTIVNOSTI | AKTIVNOSTI   | ROK         | PLAN               | IZVRŠENO         | STANJE AKTIVNOSTI   |
|--|---------------------|--|-------------|--------------------|------------------|---|
| <b>UREĐENJE<br/>SADRŽAJA JAVNE<br/>SPORTSKO<br/>REKREACIJSKE I<br/>TURISTIČKE<br/>INFRASTRUKTURE</b> | GSC                 | - idejno rješenje parkirališta Pb i drugih lokacija  | 30.11.2018. | 3.000.000<br>(PGŽ) | <b>2.929.213</b> | - izrađeno je idejno rješenje s troškovnikom za parkiralište Pb preko puta Šumarije i prostorno tehnička analiza mogućnosti korištenja stare prometnice prema Platku s pripadajućim površinama  |
|  | GSC                 | - priprema, razrada i uvođenje elektronskih karata na žičarama                                     | 15.12.2018. |                    |                  | - u 2018. provedena nabava i ugovorena dobava i ugradnja elektronskog sustava kontrole i naplate žičare Radeševo, a radovi planirani u 2019.  |
|  | GSC                 | - dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza                             | 31.12.2018. |                    |                  | - proveden je postupak nabave i ugovorena izrada glavnih projekta za rekonstrukciju staze Radeševo 2 i sabirnih kanala, u tijeku je projektiranje   |
|  | GSC                 | - priprema i izgradnja sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš<br>- nadzor | 31.12.2018. |                    |                  | - ishođene sve građevinske dozvole za Radeševo, dovršena imovinsko pravna priprema, plaćene sve upravne pristojbe<br>- pripremljena tender dokumentacija, provedena javna nabava, donesena Odluka o odabiru,<br>- potpisan između GSC i izvođača Sufag SAS Okvirni sporazum za izgradnju sustava za zasnježenje i Ugovor za 1. cjelinu radova<br>- 27.11.2018. započeli radovi na 8. fazi (akumulacija-retencija)<br>- ispostavljena i plaćena 1. situacija za izvedene radove sječe šume i dio izvedbenih projekata te otkup snage električne energije |

| CJELINA | NOSITELJ<br>AKTIVNOSTI | AKTIVNOSTI  | ROK          | PLAN | IZVRŠENO | STANJE AKTIVNOSTI   |
|---------|------------------------|---|--------------|------|----------|---|
|         | GSC                    | - izrada elaborata za zaštitu od štetnog djelovanja voda<br>- idejni i glavni projekt dovoda tehničke vode od akumulacije do domova                             | 31.12.2018.  |      |          | - elaborat za zaštitu od štetnog djelovanja voda izrađen i prosljeđen u Hrvatske vode od kojih se očekuje sufinanciranje izgradnje akumulacije,<br>- za dovod tehničke vode izrađeni projekti, predan zahtjev za lokacijsku dozvolu |
|         | GSC                    | - postava sprava za vježbanje na trim stazi   | 30.09.2018.  |      |          | - dovršeni građevinski radovi i ugrađena oprema na trim stazi na 6 stanica za vježbanje   |
|         | GSC                    | - komunalno opremanje, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.  | 31.10.2018.  |      |          | - izrađeno idejno rješenje za uređenje okoliša na akumulacijskom jezeru   |
|         | GSC                    | - priprema, nabava, uređenje i postavljanje "ljetnih" sportsko rekreacijskih sadržaja kao što su: uređenje tematskih parkova, igrališta, staza, bočalište i dr. | 31.12..2018. |      |          | - izrađeno idejno rješenje i troškovnik za 4-stazno bočalište<br>- provedena nabava i ugovoreno građenje bočališta<br>- radovi su započeli u rujnu 2018., a dovršetak je planiran u 2019.   |
|         | GSC                    | - uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak   | 31.12.2018.  |      |          | - nabavljen rabljeni ratrak i rabljeni traktor s kran dizalicom<br>- provedena nabava i ugovorena dobava ATV vozila<br>- provedena nabava i započela izrada idejnog i glavnog projekta garaže i spremišta za potrebe GSC            |

| CJELINA                        | NOSITELJ<br>AKTIVNOSTI | AKTIVNOSTI  | ROK         | PLAN             | IZVRŠENO         | STANJE AKTIVNOSTI   |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------|------------------|------------------|---|
|                                | GSC                    | - nabava ostalih usluga i izrade potrebne dokumentacije (tehnička savjetovanja, izrada koncepcija, idejnih rješenja, projekata, analiza, stručnih podloga, geodetskih podloga, programa, vizualizacija, tiskanje, objave, natječaji, usluge odvjetnika i dr.) | 31.12.2018. |                  |                  | - izvršeno geodetsko snimanje i izrada podloge za ostale sadržaje RSRTC-a<br>- ugovorena pravna i tehnička savjetovanja |
| <b>UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ</b> |                        |   |             | <b>3.012.500</b> | <b>2.934.713</b> | <b>97,42 %</b>  |
| <b>SVEUKUPNO</b>               |                        |   |             | <b>5.812.500</b> | <b>6.377.111</b> | <b>109,71 %</b>   |

Napomene:

- Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2018. usvojen Zaključkom Župana 23.4.2018.
- Okvirni sporazum o financiranju za 3 godine i Ugovor o financiranju aktivnosti projekta za 2018. potpisan između PGŽ i GSC 17.5.2018.
- Odluku o izmjeni Odluke o financiranju izgradnje sustava za zasnježenje i ostalih cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak za razdoblje 2018.-2020. Županijska skupština donijela 27.9.2018.
- Dodatak 1. Okvirnom sporazumu između PGŽ i GSC potpisan 31.10.2018. i Dodatak 1. Ugovoru potpisan 10.12.2018.
- Izmjena Plana aktivnosti provedbe projekta za 2018. usvojena Zaključkom Župana 3.12.2018.
- U 2018. su realizirana dodatna sredstva, preostala sredstva projekta iz Proračuna za 2017. koja su uvrštena u 1. rebalans Proračuna za 2018., po ugovoru s GSC 304.382 kn i po ugovoru za imovinsko pravnu pripremu 12.500 kn

Izradila:

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.  
Viša savjetnica za infrastrukturu II  
Voditeljica Projektnog tima za operativnu  
provedbu projekta RSRTC Platak
