



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 363-01/15-03/2
URBROJ: 2170/1-09/3-15-93

Rijeka, 21. rujna 2015.

**PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR
PLATAK U 2015. GODINI**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradile:

Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ. *Stipetić*
Tanja Zatezalo, dipl.iur. *Zatezalo*

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan Primorsko-goranske županije donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugom propisu, te aktima Skupštine Primorsko-goranske županije.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

Program provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (u daljnjem tekstu: RSRTC Platak ili projekt Platak) usvojen je na 38. sjednici Županijske skupštine održanoj 9. travnja 2013. godine (KLASA:021-04/13-01/3, URBROJ:2170/1-01-01/4-13-25 - u daljnjem tekstu: Program).

Na 8. sjednici Županijske skupštine održanoj 3. travnja 2014. godine usvojene su Izmjene Programa (KLASA: 021-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-52). Program je izmijenjen na način da trogodišnji Plan aktivnosti provedbe projekta Platak više nije sastavni dio Programa odnosno izmijenjena je točka IV. Programa na način da godišnji Plan aktivnosti provedbe projekta s naznakom nositelja aktivnosti po objektima za tekuću godinu donosi Župan na prijedlog Projektnog tima za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak, a putem proračunski nadležnog upravnog odjela Županije.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 kuna.

Na 15. sjednici Županijske skupštine održanoj 26. veljače 2015. godine izvršen je raspored sredstava za korisnika Goranski sportski centar d.o.o. (u daljnjem tekstu: GSC), u svrhu provedbe projekta RSRTC Platak u 2015. godini. Na istoj sjednici Županijske skupštine usvojene su i druge Izmjene Programa provedbe projekta Platak (KLASA: 021-04/15-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-13 od 26. veljače 2015. godine), sukladno kojima je GSC nadležan za ugovaranje i izvođenje radova na rekonstrukciji parkirališta na Platku.

Plan aktivnosti provedbe projekta Platak u 2015. godini usvojen je Zaključkom Župana od 2. ožujka 2015. (KLASA: 022-04/15-01/8; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-8 – u prilogu), a prethodno je usvojen na sjednici Projektnog tima za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak održanoj 3. veljače 2015. godine.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu predloženo je smanjenje iznosa financiranja projekta Platak za iznos od 1.000.000,00 kn prvenstveno zbog ušteda po dovršenim postupcima javnih nabava i dijela poslova koji će se sufinancirati od strane Ministarstva turizma i realizirati u sljedećoj godini.

Na sjednici Projektnog tima za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak održanoj 21. rujna 2015. godine raspravljen je i usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta u 2015. godini.

Najvažnije izmjene i dopune planiranih aktivnosti u 2015. godini odnose se na sljedeće:

- od strane Ministarstva turizma po provedenom javnom pozivu za dodjelu sredstva iz Fonda za razvoj turizma u 2014. godini Županiji su dodijeljena sredstva za izradu glavnog projekta za Akumulaciju 2 i sustav za zasnježenje kao i uređenje Bike parka Radeševo odnosno donesene su odluke o odabiru i dostavljeni su nacrti ugovora koji su potpisani od strane Županije, ali još uvijek nisu zaprimljeni potpisani primjerci ugovora od strane Ministarstva; u 2015. godini planirana je izrada glavnog projekta Akumulacije 2 pri čemu je po uvjetima natječaja Ministarstva Županija nositelj aktivnosti;
- na sastancima Projektnog tima i redovnim mjesečnim sastancima s GSC-om zaključeno je da se postavljanje tubinga, drive-in kina, izrada idejnih projekata za zone: Gornje Radeševo, Tešanj i Pribeniš odgodi za sljedeće razdoblje te je izostavljeno u ovim izmjenama Plana;
- dopunjen je tekst Plana aktivnosti u manjem dijelu radi pojašnjenja vrste aktivnosti;
- s obzirom da su u Planu aktivnosti definirane grupe radova i aktivnosti koje se pojedinačno provode kroz cijelu godinu s različitom dinamikom i neke su već i završene, u tablici su izmijenjeni rokovi na način da je naveden planirani rok prema zadnjoj aktivnosti koja će se izvršiti.

Također, u rujnu 2015. godine povodom objavljenog javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini Županija je prijavila projekt izgradnje Akumulacije 2 u zoni Radeševo na području RSRTC Platak te projekt izgradnje Centra za posjetitelje Platak.


Pored navedenih aktivnosti, nastavlja se realizacija Ugovora br. 09/02-12/02 o vršenju usluge imovinsko-pravne pripreme zemljišta za Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

Vlada Republike Hrvatske je početkom veljače 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak („Narodne novine“ broj 17/15) prema ishodenoj lokacijskoj dozvoli za zonu Radeševo.

Sve čestice u zoni Radeševo su u vlasništvu Republike Hrvatske i imaju status šumskog zemljišta. Temeljem izmijenjenog članka 51. Zakona o šumama propisano je da se šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Prostornim planom proglašene građevinskim područjem, izdvajaju iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske danom stupanja na snagu Prostornog plana kojim su uključene u građevinsko područje uz uvjet da je Ministarstvo poljoprivrede na predmetni Prostorni plan dalo prethodno mišljenje. Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13) centar Platak je određen kao građevinsko područje sportske namjene – mješoviti sportski centar (centar za zimske i ljetne sportove) i Ministarstvo poljoprivrede je sudjelovalo u postupku donošenja istoga. Slijedom navedenog, početkom 2015. godine podneseni su zahtjevi Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) podijeljeni prema osnovama uređenja imovinsko-pravnih odnosa: pravo građenja i pravo služnosti. Navedeni postupci su u tijeku, u 2015. godini nastavljen je intenzivan rad na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na svim nekretninama u sklopu zone Radeševo, a prioritetno vezano za Akumulaciju 2 i sustav za zasnježenje. Prema zadnjim informacijama dobivenim od

referentice DUUDI-ja zadužene za rad na predmetima projekta Platak ispunjene su sve pretpostavke za donošenje odluka te se očekuje skoro okončanje ovih postupaka

Grafički prikaz 1: Pregledna karta skijaških zona u sklopu RSRTC Platak

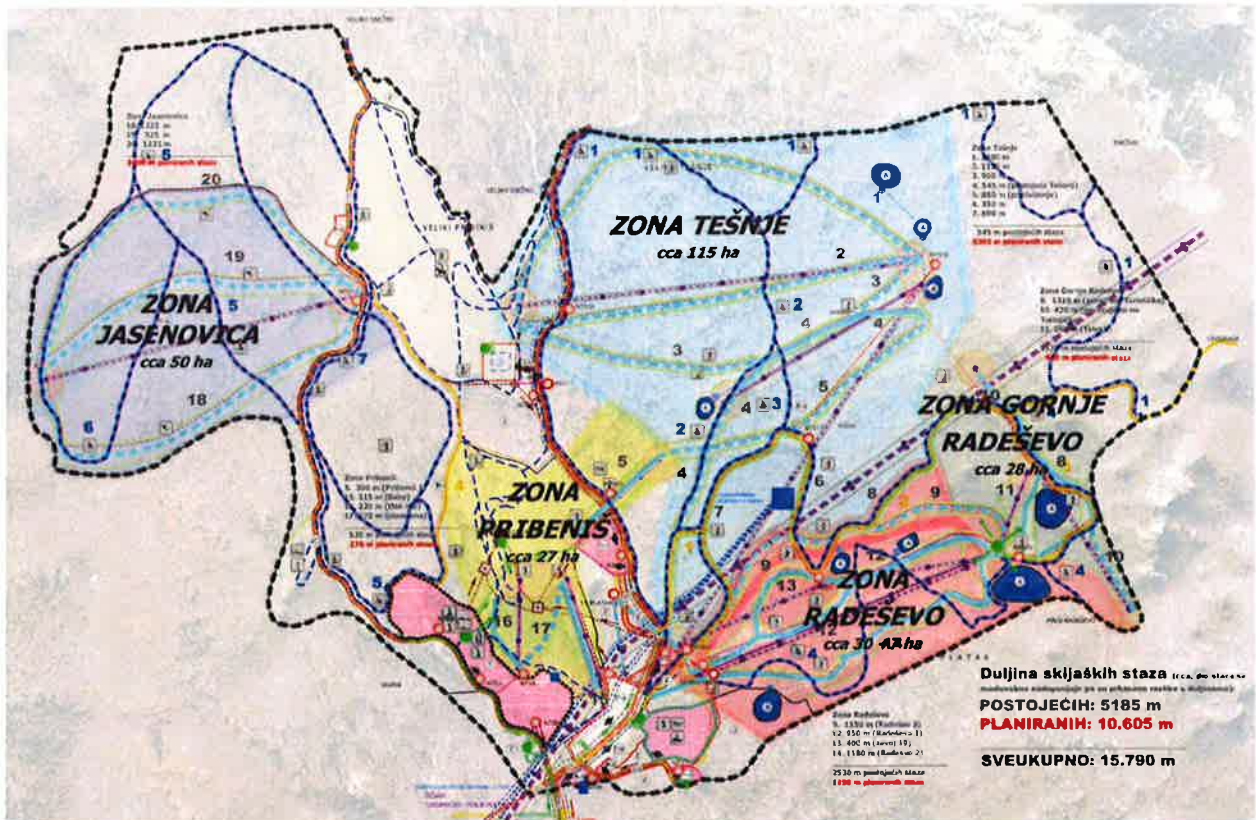

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Čavle i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu: KD VIK) potpisali su 7. svibnja 2013. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (u daljnjem tekstu: Sporazum). Predmet Sporazuma je izrada idejnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz vodoopskrbnog sustava koji je u nadležnosti KD VIK uključujući izgradnju novih vodosprema Kovačevo i Platak, crpnih stanica i cjevovoda. Planirani rok za izvršenje predmeta Sporazuma je tri godine i ističe 2016. godine.

Sukladno Sporazumu izrada idejnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava, koja je procijenjena na 2,7 milijuna kuna (bez PDV-a), obaveza je KD VIK. Izrada idejnih projekata ugovorena je u mjesecu rujnu 2014. godine. Projektiranje je u tijeku te se, prema navodima KD VIK, tijekom 2015. očekuje dovršetak izrade idejne tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijskih dozvola za svih 16 građevina u zoni zahvata dogradnje vodoopskrbnog podsustava područja Grobinštine i gradnje podsustava za transport vode na Platak. Također, KD VIK navodi da je u 2016. godini planirana izrada glavnih projekata, procijenjene vrijednosti 5 milijuna kuna, a za što će biti potrebno pristupiti potpisivanju novog sporazuma.

Sukladno Sporazumu izrada projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenske Akumulacije 2 kao i troškovi izgradnje Akumulacije 2 (koji su procijenjeni na 7 milijuna kuna) obaveza je Primorsko-goranske županije. U tijeku je projektiranje

glavnog projekta Akumulacije 2 i kako je već navedeno sufinancira se sredstvima Ministarstva turizma, a istovremeno je sukladno novom javnom pozivu Ministarstva turizma u 2015. godini prijavljen projekt izgradnje Akumulacije 2.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se usvajanje Izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta Platak u 2015. godini.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU

Za provođenje ovoga akta osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u okviru razdjela 9 - Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u sklopu programa 90 03 08 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju točke IV. Programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (KLASA:021-04/13-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-25 od 9. travnja 2013. godine, KLASA: 021-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-52 od 3. travnja 2014. godine i KLASA: 021-04/15-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-13 od 26. veljače 2015. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana __ ožujka 2015. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Donose se Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini.

(Izmjene i dopune Plana aktivnosti sastavni su dio ovog Zaključka).

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak Ugovoru o financiranju aktivnosti u provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini s Goranskim sportskim centrom d.o.o.

Na temelju točke IV. Programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (KLASA:021-04/13-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-25 od 9. travnja 2013. godine, KLASA: 021-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-52 od 3. travnja 2014. godine i KLASA: 021-04/15-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-13 od 26. veljače 2015. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2015. godine donio je

**Izmjene i dopune
Plana aktivnosti provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
u 2015. godini**

I.

U Planu aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini od dana 2. ožujka 2015. godine (KLASA: 022-04/15-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-9) u stavku 1. točke 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme, **izrade projektne dokumentacije** i praćenju provedbe projektnih aktivnosti.“

II.

Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od strane Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, navedene su u tablici koja je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

**TABLICA- IZMJENE I DOPUNE PLANA AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA
REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR
PLATAK U 2015. GODINI**

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
IDEJNI PROJEKT VODOOPSKRBE PLATKA	ViK	- izrada idejnog projekta za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2015.	3.375.000
IMOVINSKO- PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- provođenje aktivnosti za dobivanje pravnog osnova za uređenje zone Radeševo	kontinuirano	25.000
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	GSC	- uređenje 4. faze parkirališta	01.11.2015.	5.500.000
		- kontrolni pregled žičare Tešanj (uključujući nabavu opreme potrebne za montažu vučnih motki te ostali potrebni radovi za stavljanje u operativnu funkciju uključujući trošak kontrolnog pregleda)	30.10.2015.	
		- uređenje skijaških i sanjkaških staza (građevinsko i nabavka opreme, pokretnih traka , sustav za zasnježenje)	01.12.2015.	
		- uređenja kontejnera za GSC, GSS i prodaju karata (oblaganje, izrada krovova), izrada nadstrešnica, nabavka opreme za prodaju ski-karata, dovršetak uređenja platoa, turistička signalizacija i info-pano, te drugi poslovi i oprema	15.11.2015.	
	GSC	- izrada projekata sa troškovnikom za povezivanje skijaških staza Tešnje i Pribeniš te Pribeniš 2, te analiza potreba proširenja i uređenja „turističke“ staze kao i mogućnost povezivanja Tešnja sa „turističkom“ stazom	01.10.2015.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC	- izrada idejnog projekta sa troškovnikom za stazu Radeševo 3	01.10.2015.	
	GSC	- priprema sveukupne završne procjene ukupno potrebnih kapitalnih ulaganja u sanaciju vučnica Telekit, Pribeniš 2 te Pribeniš 3 (INA-ina vučnica) sa potrebnim ulaganjima u staze i ostalu opremu te priprema dijela projektne dokumentacije	30.10.2015.	
	GSC	<ul style="list-style-type: none"> - nabava opreme potrebne za izdavanje skijaških karata - osiguranje besplatnog wi-fi na gravitacijskom području staza - ugradnja live web camova na svim strateškim lokacijama - ugradnja digitalnih info panela - nabava ručnih freza za čišćenje snijega - komunalno opremanje - ostala potrebna oprema i vozila / radni strojevi za održavanje i poslovanje objekata 	01.11.2015.	
	GSC	- priprema, nabava i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: dječji SNOW parkovi (uz svaku pokretnu traku), portali na napuhavanje, trampulini, dječji vrtići na snijegu, sanjke i dr.	15.11.2015.	
	GSC	- priprema, nabavka i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: uređenje ugostiteljskih objekta (na dnu i vrhu Radeševa), označavanje sportskih terena na parkingu, nabava sportskih rekvizita, nabava go kart autića , dvoraca na napuhavanje, kampa za izviđače, kontejnera za WC, svlačionica, uređenje dječjeg igrališta, uređenje tematskih parkova i dr.	15.11.2015.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	UO RRIUP	- izrada glavnog projekta za Akumulaciju 2 u zoni Radeševo	15.12.2015.	238.750
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				5.763.750
SVEUKUPNO				9.138.750

BYMA STROJ
inženjering d.o.o.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/15-01/8
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-8
Rijeka, 2. ožujka 2015.

Primljeno :	10.03.15
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
363-01/ 15-03/ 2	09 11
Urudžbeni broj	Pril Vrij
2170/1-15-32	- -

pred. kod ref.

Na temelju točke IV. Programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (KLASA:021-04/13-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-25 od 9. travnja 2013. godine i KLASA: 021-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-52 od 3. travnja 2014. godine i KLASA: 021-04/15-01/1; URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-13 od 26. veljače 2015. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. ožujka 2015. godine donio je sljedeći

Zaključak

1. Donosi se Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini.
(Plan aktivnosti sastavni je dio ovog Zaključka).
2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja ovog Zaključka pripremi Ugovor o financiranju aktivnosti u provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini s Goranskim sportskim centrom d.o.o.
3. Utvrđuje se da se, osim aktivnosti iz Plana iz točke 1. ovog Zaključka, u 2015. godini nastavljaju aktivnosti na rješavanju vodoopskrbe sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak sklopljenom 7. svibnja 2013. godine između Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Čavle i Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
4. Utvrđuje se da su radovi na žičari Radeševo te vučnici Pribeniš i Baby lift završeni u 2014. godini i kao takvi nisu predmet investicije u 2015. godini te će se sredstva za njihov rad osigurati u okviru redovnog poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Na temelju točke IV. Programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015. (KLASA:021-04/13-01/3, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-25 od 9. travnja 2013. godine i KLASA: 021-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-52 od 3. travnja 2014. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. ožujka 2015. godine donio je

**Plan aktivnosti provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
u 2015. godini**

I.

Nositelji aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini su:

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u dijelu imovinsko pravne pripreme i praćenju provedbe projektnih aktivnosti,

Goranski sportski centar d.o.o. u provedbi projektnih aktivnosti uređenje 4. faze parkirališta i javne turističke infrastrukture,

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u dijelu izrade idejnog projekta za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz riječkog vodoopskrbnog sustava.

II.

Plan provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini, sukladno prijedlogu usvojenom od strane Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, čine aktivnosti navedene u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/15-01/8
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-9
Rijeka, 2. ožujka 2015.



Zlatko Komadina, dipl.ing.

TABLICA - PLAN AKTIVNOSTI PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2015. GODINI

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
IDEJNI PROJEKT VODOOPSKRBE PLATKA	ViK	- izrada idejnog projekta za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.	31.12.2015.	3.375.000
IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZONE RADEŠEVO	UO RRIUP	- provođenje aktivnosti za dobivanje pravnog osnova za uređenje zone Radešvo	kontinuirano	25.000
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	GSC	- uređenje 4. faze parkirališta	01.11.2015.	6.500.000
		- kontrolni pregled žičare Tešanj (uključujući nabavu opreme potrebne za montažu vučnih motki te ostali potrebni radovi za stavljanje u operativnu funkciju uključujući trošak kontrolnog pregleda)	01.04.2015.	
		- uređenje skijaških staza (građevinsko i nabavka opreme, sustav za zasnježenje)	01.11.2015.	
	GSC	- uređenja kontejnera za GSC, GSS i prodaju karata (oblaganje, izrada krovova), izrada nadstrešnica, nabavka opreme za prodaju ski-karata, dovršetak uređenja platoa, turistička signalizacija i info-pano, te drugi poslovi i oprema		
GSC	- izrada glavnih projekata za Akumulaciju 2 sa nakapnom površinom i sustava za zasnježenje staze Radešvo 1 i Radešvo 2 (temeljem ishodovane lokacijske dozvole)	01.08.2015.		

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC	- izrada projekata sa troškovnikom za povezivanje skijaških staza Tešnje i Pribeniš te Pribeniš 2, te analiza potreba proširenja i uređenja „turističke“ staze kao i mogućnost povezivanja Tešnja sa „turističkom“ stazom	01.10.2015.	
	GSC	- izrada idejnih projekata za zone Gornje Radeševo, Pribeniš i Tešanj sa ishodomvanjem lokacijskih dozvola te idejnog projekta sa troškovnikom za stazu Radeševo 3	01.10.2015.	
	GSC	- uređenje BIKE parka za downhill biciklizam (uključuje i ugradnju nosivih konstrukcija za bicikle na žičaru Radeševo)	15.06.2015.	
	GSC	- priprema sveukupne završne procjene ukupno potrebnih kapitalnih ulaganja u sanaciju vučnica Telekit, Pribeniš 2 te Pribeniš 3 (INA-ina vučnica) sa potrebnim ulaganjima u staze i ostalu opremu te priprema dijela projektne dokumentacije	01.08.2015.	
	GSC	- nabava opreme potrebne za izdavanje skijaških karata - osiguranje besplatnog wi-fi na gravitacijskom području staza - ugradnja live web camova na svim strateškim lokacijama - ugradnja digitalnih info panela - nabava ručnih freza za čišćenje snijega - komunalno opremanje - ostala potrebna oprema za održavanje i poslovanje objekata	01.11.2015.	
	GSC	- priprema, nabava i postavljanje „zimskih“ sadržaja kao što su: dječji SNOW parkovi (uz svaku pokretnu traku), tubinzi, portali na napuhavanje, trampulini, dječji vrtići na snijegu, sanjke i dr.	15.10.2015.	

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	ROK	PROCJENA VRIJEDNOSTI S PDV-om (kn)
	GSC	<ul style="list-style-type: none"> - priprema, nabavka i postavljanje "ljetnih" sadržaja kao što su: uređenje ugostiteljskih objekta (na dnu i vrhu Radeševa), označavanje sportskih terena na parkingu, nabava sportskih rekvizita, nabava bicikala, dvoraca na napuhavanje, kampa za izviđače, kontejnera za WC, svlačionica, uređenje dječjeg igrališta, uređenje tematskih parkova i dr. - Drive in kino sa svom potrebnom opremom (frekvencijski odašiljač, platno...) 	15.06.2015.	
SVEUKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ				6.525.000
