



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Ž u p a n**

- 1. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK ZA 2016. GODINU**
- 2. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Županijska skupština  
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem

- Informaciju o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu*
- Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak*

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
n/r predsjednika Erika Fabijanića

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem

- a) **Informaciju o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu**
- b) **Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak**

Za svojeg predstavnika, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Ljudevita Krpana**, pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

*Ž u p a n*

Zlatko Komadina, dipl.ing.

## **1. PRAVNI OSNOV**

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14) jedinice područne (regionalne) samouprave definirane su kao nositelji planiranja razvoja za svoje područje te se u tom smislu nastoji stvoriti uvjete koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala kroz realizaciju razvojnih investicijskih projekata.

Temeljem članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16), sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktima Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna. Kako je iznos u Proračunu za 2017. godinu, planiran za projekt Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak veći, Županijskoj skupštini predlaže se donošenje zaključka o rasporedu sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. (GSC) i Županijskoj upravi za ceste (ŽUC).

## **2. OBRAZLOŽENJE**

### **2.1. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR (RSRTC) PLATAK ZA 2016. GODINU**

Županijska skupština je 25. veljače 2016. donijela Zaključak o rasporedu sredstava iz Županijskog proračuna za 2016. godinu za realizaciju aktivnosti provedbe projekta korisnicima GSC-u i ŽUC-u.

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu program RSRTC Platak planiran je u iznosu od 6.389.000,00 kn, a po Završnom računu Proračuna za 2015. godinu odnosno prijenosu sredstava za započete aktivnosti te Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu, projekt je planiran u iznosu od 7.497.963,23 kn.

Plan aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2016. godinu usvojen je Zaključkom Župana od 7. ožujka 2016., a prethodno utvrđen na sjednici Projektnog tima održanoj 2. veljače 2016. Zaključkom Župana od 11. srpnja 2016. usvojene su Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2016. godinu, prethodno utvrđene na sjednici Projektnog tima održanoj dana 27. lipnja 2016. Zaključkom Župana od 10. listopada 2016. usvojene su II. Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za 2016. godinu, prethodno utvrđene na sjednici Projektnog tima održanoj dana 30. rujna 2016.

Temeljem navedenih zaključaka i usvojenog Plana za 2016. godinu između Primorsko-goranske županije (PGŽ) i GSC-a 11. ožujka 2016. sklopljen je Ugovor o financiranju aktivnosti u provedbi projekta RSRTC Platak, 18. srpnja 2016. sklopljen je Dodatak 1. Ugovoru i 13. listopada 2016. sklopljen je Dodatak 2. Ugovoru.

Između PGŽ i ŽUC-a 11. ožujka 2016. sklopljen je Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije ceste Ž 5030 na području RSRTC Platak, a 18. srpnja 2016. sklopljen je Dodatak 1. Ugovoru.

U Županijskom proračunu za 2016. godinu je za Projekt RSRTC Platak planirano ukupno 7.497.963,23 kn. Ukupni planirani iznos je sadržavao sredstva prema Planu aktivnosti za 2016. godinu, sredstva po Završnom računu za 2015. godinu u iznosu od 1.357.163,23 kn za: ugovorene radove GSC-a za dovršenje radova pokretne trake Baby lift i uređenje pokosa skijaške staze Radeševo, dodijeljena sredstva Ministarstva turizma

za glavni projekt sustava za zasnježenje Radeševo i uređenje biciklističkog parka Radeševo te sredstva za imovinsko-pravnu pripremu.

U Županijskom proračunu je za Projekt RSRTC Platak ukupno izvršeno 7.442.382,43 kn odnosno 99,3%.

Osim sredstava iz Proračuna PGŽ u Planu aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak za aktivnost izrade projekata vodoopskrbe Platka, a putem trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka pod radnim nazivom projekta „Izrada idejne tehničke dokumentacije za dogradnju podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za vodoopskrbu Platka“ utrošeno je 100.000,00 kuna, a Županijska uprava za ceste je utrošila još 225.251,00 kn za uređenje dionice ceste Ž 5030.

U nastavku se nalazi tablica s prikazanim grupama poslova i aktivnostima i izvršenim financijskim sredstvima iz Županijskog proračuna i izvješće po grupama radova.

Izvršenje Programa provedbe projekta RSRTC Platak u 2016. iz Proračuna PGŽ

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE (kn)
UREĐENJE CESTE Ž 5030	ŽUC	- uređenje ceste Ž 5030 II faza, dionica Platak-Pod Platak	2.400.000
UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA OPREME)	GSC	- dovršenje postave pokretne trake Baby lift i uređenja pokosa staze Radeševo	1.071.721,20
		- postava pokretne trake na Pribenišu - postava tubeinga na Radeševu, - uređenje i opremanje dva dječja igrališta - nabava vrtuljka za snježni park - nabava koševa za smeće, rasvjete na bočalištu, klupica, zaštitnih mreža za potrebe skijališta i sanjkališta. - Uređenje gornjeg stroja turističke staze - nabava kombi vozila - Nabava tri skladišna kontejnera i jednog uredskog kontejnera za voditelja - nabava opreme: rezervoara za pitku vodu, visokotlačnog perača, auto prikolice, mobilnih radio stanica, plastičnih sanjki, bicikla, nosiljki za djecu za bicikle te biciklističkih kaciga.	3.267.942,61

AKTIVNOST	NOSITELJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE (kn)
PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	GSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrada koncepcijskog rješenja sustava za zasnježenje skijaških staza i usporedne analize u zoni Radeševo</li> <li>- Izrada idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za akumulaciju 2 i sustav za zasnježenje zone Radeševo, te idejnog projekta sustava za zasnježenje skijaških staza Baby lift i Pribeniš.</li> <li>- Izrada troškovnika za prioritetne radove na ski stazama Radeševo 1 i Radeševo 2</li> <li>- Izrada idejnog rješenja proširenja parkirališta kraj Malog doma (Sušak)</li> <li>- Izrada projekta za dječja igrališta</li> </ul>	
UREĐENJE BICIKLISTIČKIH DOWNHILL STAZA	UORRIUP	- uređenje biciklističkog parka za downhill biciklizam	269.218,62
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I NADZOR GRAĐENJA	UORRIUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dovršenje Glavnog projekta Akumulacije 2</li> <li>- izrada Glavnog projekta sustava za zasnježenje Radeševo</li> <li>- usluge nadzora uređenja biciklističkog parka</li> </ul>	433.500,00
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>7.442.382,43</b>

### 2.1.1. Uređenje sadržaja javne turističke infrastrukture

Tijekom 2016.godine na području RSRTC Platak postavljena su dva dječja igrališta na lokacijama pokraj Velikog doma i polazne stanice žičare Radeševo. Također je dobavljen višenamjenski vrtuljak za djecu, postavljen u dolini Pribeniš, namijenjen za zimsko-ljetno korištenje.

Nabavljen je niz sadržaja namijenjenih povećanju zadovoljstva korisnika kao što su rasvjeta na bočalištu, klupice, zaštitne mreže za potrebe skijališta i sanjkališta, dodatni koševi za smeće. Također su nabavljeni bicikli, plastične sanjke, nosiljke za djecu koje se postavljaju na bicikle, biciklističke kacige.

Za potrebe poboljšanja rada pratećih službi nabavljena su tri skladišna kontejnera koji su postavljeni u blizini polazne stanice žičare Radeševo i jedan uredski kontejner za voditelja koji se nalazi na parkiralištu. Po provedenom postupku nabave, za potrebe prijevoza osoba na području RSRTC Platak nabavljeno je kombi vozilo. Još je nabavljena oprema kao što je kuka za vuču za terensko vozilo, rezervoar za pitku vodu, pumpa za pretakanje ulja, cjepač drva, anemometar, auto prikolica, visokotlačni perlač, mobilne radio stanice.

Za sanjkalište Pribeniš kraj Velikog doma dobavljena je i montirana pokretna traka Pribeniš dužine 78 m. Dobavljena je i montirana tubeing staza sa zavojima Radeševo dužine 160 m. Uređen je gornji stroj razastiranjem tampona na Turističkoj stazi Radeševo te dovršeni radovi na sanaciji pokosa skijaške staze Radeševo 1.

U 2016. godini dovršeni su započeti radovi u 2015. godini na postavljanju pokretne trake Baby lift dužine 200 m.

Uz sufinanciranje Ministarstva turizma, uređene su u zoni Radeševo dvije biciklističke staze za downhill biciklizam: crvena, teža, downhill, u dužini 1500m i zelena, lakša, flow u dužini 2000 m.



Dječje igralište na Platku



Pokretna traka Baby lift i višenamjenski vrtuljak



Objekti u skijaškoj zoni Radeševo – žičara, pokretna traka, tubeing, caffe rotonda, sanitarni čvor

### **2.1.2. Izrada projektne dokumentacije**

Od projektne dokumentacije, za daljnje potrebe projekta odnosno uređenja i dopune sadržaja više zona unutar RSRTC Platak izrađeno je Konceptijsko rješenje sustava za zasnježenje skijaških staza i usporedne analize u zoni Radeševo, Pribeniš i Baby lift te je utvrđena najpovoljnija varijanta, potom je izrađen Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za Akumulaciju 2 i sustav za zasnježenje zone Radeševo te Idejni projekt sustava za zasnježenje skijaških staza Baby lift i Pribeniš, troškovnik za izvođenje prioritetnih radova na skijaškim stazama Radeševo 1 i Radeševo 2 te tehničko rješenje uređenja parkirališta kraj Malog doma (Sušak).

Za potrebe rješenja prometa na Platku, posebice zbog potreba u vrijeme vršnih opterećenja prometa vikendom i parkiranja u zimskom razdoblju, izvršene su analize i prijedlog rješavanja kritičnih točaka, analize mogućih lokacija te su poduzete mjere obavješćivanja o zauzetosti parkirališta putem medija kao i organizirana regulacija na samoj lokaciji Platka i na početku ceste Ž 5030.

Uz sufinanciranje Ministarstva turizma izrađen je Glavni projekt sustava zasnježenja za skijaške staze Radeševo. Ishođena je građevinska dozvola za izgradnju nove Akumulacije 2 za potrebe zasnježenja volumena 44.000 m<sup>3</sup>.

### **2.1.3. Uređenje ceste Ž 5030 II faza**

Cesta ŽC 5030 proteže se od Velikog doma Platak do državne ceste D3 ukupne dužine 8,7 km. Od strane ŽUC-a kao nositelja aktivnosti od 2013. do 2016. godine sanirano/rekonstruirano je 300 m' kroz parkiralište te nadalje kontinuirano od parkirališta



do lokaliteta Pod Platak u dužini 3.140 m', odnosno ukupno 3.440 m'. Izrađena je projektna dokumentacija za dionicu od lokaliteta „Pod Platak“ u dužini 3.300 m' prema D3.

U 2016. godini ŽUC je nakon provedene javne nabave ugovorio radove na dionici od Vidikovca tzv. II faza u dužini 1,1 km u obimu osiguranih sredstava. Za dovršenje cjeline uključujući signalizaciju provedena je naknadno još jedna nabava te su ugovoreni dodatni radovi. Kako radovi ovise o vremenskim uvjetima, prije zimske sezone u studenom su dovršeni građevinski radovi. Postavljeni su odbojnici i vertikalna prometna signalizacija. Ispostavljena je okončana situacija te su realizirana sva sredstva iz Županijskog proračuna.



#### **2.1.4. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) 11- Sportski centar Platak R6<sub>2</sub>**

Jedna od aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak je i Izmjena i dopuna UPU SC Platak koju provodi Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ.

Na Općinskom vijeću Općine Čavle 12. ožujka 2015. godine donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 11 - sportski centar Platak R6<sub>2</sub> (SN PGŽ br. 7/15) kojom su utvrđeni ciljevi izmjena i dopuna Plana.


Urbanistički plan uređenja 11 – sportski centar Platak R62 (u daljnjem tekstu Plan) usvojen 2011. godine (SN PGŽ br. 9/11, SN PGŽ br.16/16) podloga je za sve aktivnosti projekta i ishođenje akata prostornog uređenja i građenja. Plan je izrađen u skladu s tada važećom prostorno-planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom.

Iza donošenja Plana doneseni su novi Prostorni plan PGŽ (SN PGŽ 32/2013) i Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013) i Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013), a u međuvremenu su se utvrdile i dodatne potrebe za realizacijom unutar Planom obuhvaćenog područja koje zahtijevaju izradu njegovih izmjena i dopuna.

Odlukom o izradi utvrđeni su sljedeći ciljevi izmjena i dopuna Plana:

- usklađivanje s novom zakonodavnom regulativom (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
- usklađivanje s dokumentima prostornog uređenja šireg područja (III. izmjenama i dopunama Prostornog uređenja Općine Čavle (SN 2/13), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN 32/13)
- preispitivanje centralnog turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima i sadržajima sporta, rekreacije i ugostiteljskih sadržaja osobito vezno uz položaj, kapacitete i veličinu te definiranje parametara za gradnju,
- korekcija namjene dijela površina zaštitnog zelenila u grafičkom dijelu i dijelu provedbenih odredbi kojima će se omogućiti sportsko rekreacijska namjena odnosno namijeniti je za piknik odmorišta i izviđački odnosno skautski centar,
- osiguranje prostornih i ostalih preduvjeta za gradnju i uređenje sportskih igrališta, smještaj adrenalinskih sportova i sportova pustolovnog turizma,
- utvrđivanje uvjeta uređenja kampa,
- preispitivanje infrastrukturnog opremanja uključujući akumulacije vode.

Zavod za prostorno uređenje je u 2016. godini pripremio, a početkom 2017. godine izradio Prednacrt prijedloga plana odnosno Konceptciju koja će ići na raspravu i usvajanje u proceduri prema zakonskim odredbama i rokovima.

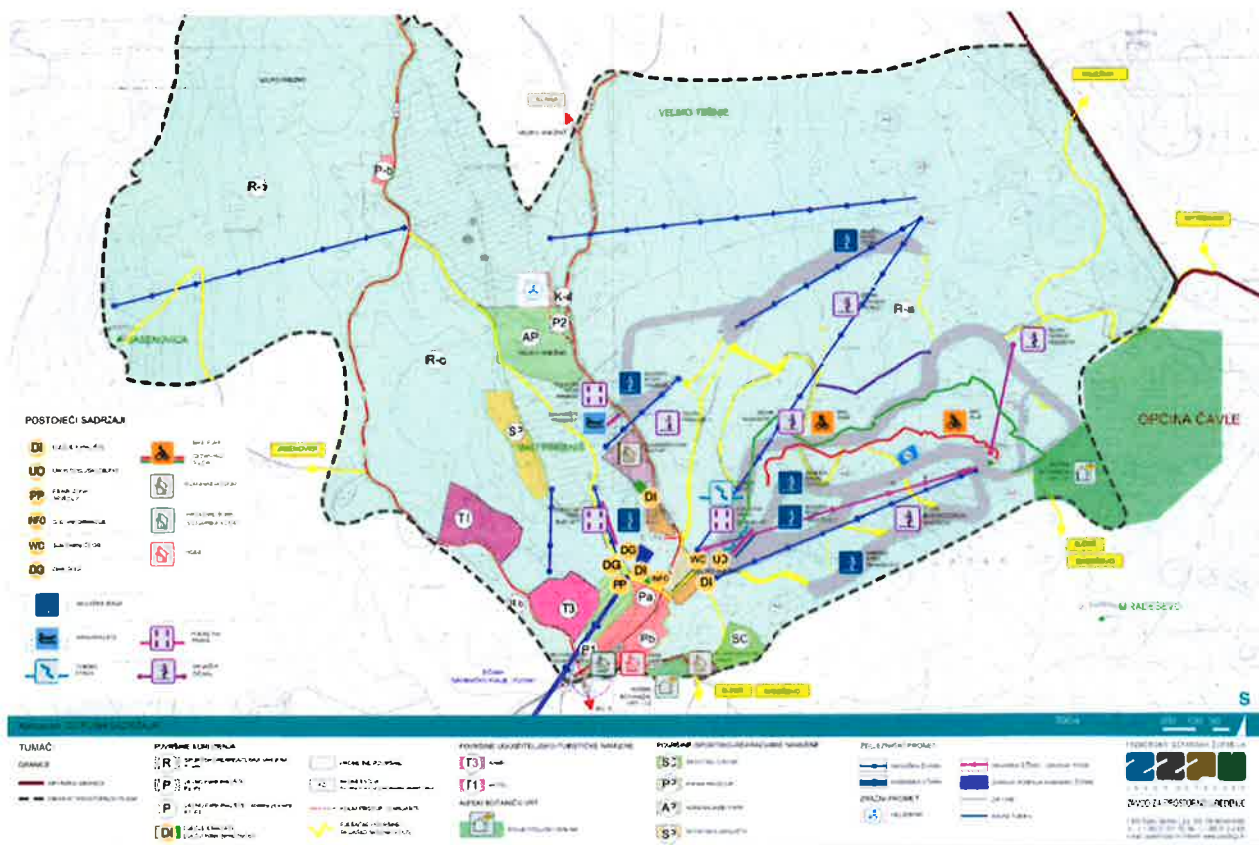

## 2.1.5. Imovinsko-pravna priprema

Aktivnosti imovinsko-pravne pripreme skijališta Radeševsko i ostalog dijela Centra Platak započeli su krajem 2012. godine. Izdana je lokacijska dozvola za zonu Radeševsko koji je postala izvršna te su izrađena dva parcelacijska elaborata koja su sredinom 2014.

godine provedena u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

Vlada Republike Hrvatske je početkom veljače 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak („Narodne novine“ broj 17/15) prema ishođenoj lokacijskoj dozvoli za zonu Radeševo.

Sve čestice u zoni Radeševo su u vlasništvu Republike Hrvatske i imaju status šumskog zemljišta. Temeljem izmijenjenog članka 51. Zakona o šumama propisano je da se šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su Prostornim planom proglašene građevinskim područjem, izdvajaju iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske danom stupanja na snagu Prostornog plana kojim su uključene u građevinsko područje uz uvjet da je Ministarstvo poljoprivrede na predmetni Prostorni plan dalo prethodno mišljenje. Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13) centar Platak je određen kao građevinsko područje sportske namjene – mješoviti sportski centar (centar za zimske i ljetne sportove) i Ministarstvo poljoprivrede je sudjelovalo u postupku donošenja istoga. Slijedom navedenog, početkom 2015. godine podneseni su zahtjevi Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) podijeljeni prema osnovama uređenja imovinsko-pravnih odnosa: pravo građenja i pravo služnosti za skijaške staze, sustav za zasnježenje i akumulacije te ugostiteljsko smještajni objekt tzv. Kolibu skijaša.

Jedan od postupaka je dovršen u 2015. godini te je u studenom 2015. između RH i GSC sklopljen Ugovor o pravu služnosti u svrhu izgradnje infrastrukture sustava za zasnježenje.

U 2016. godini nastavljen je intenzivan rad na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na svim nekretninama u sklopu zone Radeševo, a prioritetno vezano za novu Akumulaciju 2. Dana 4. kolovoza 2016. godine donesena je Odluka o osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje Akumulacije 2 sa crpnom stanicom – pumpaonicom i rekonstrukcije Akumulacije 1 sa sustavom za zasnježenje. U tijeku je procedura potpisivanja ugovora.

#### **2.1.6. Aktivnosti na rješavanju vodoopskrbe**

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Čavle i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu VIK) potpisali su 7. svibnja 2013. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji vodoopskrbe Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (u daljnjem tekstu: Sporazum) s rokom od 3 godine. Predmet Sporazuma bila je prvenstveno izrada idejnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz vodoopskrbnog sustava koji je u nadležnosti VIK-a uključujući izgradnju novih vodosprema Kovačevo i Platak, crpnih stanica i cjevovoda kao i akumulacije za zasnježenje.

Izrada idejnih projekata, koju kao aktivnost provodi ViK ugovorena je u rujnu 2014. godine. Projektiranje idejnih projekata je završeno te su predani zahtjevi za ishođenje lokacijskih dozvola za svih 16 građevina u zoni zahvata dogradnje vodoopskrbnog podsustava područja Grobinštine i gradnje podsustava za transport vode na Platak. Utrošeno je 3,37 milijuna kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Ishođeno je 15 lokacijskih dozvola, još jedan postupak je u tijeku.

Sukladno Sporazumu za izradu projektne dokumentacije Akumulacije 2 bila je zadužena Primorsko-goranska županija. Projektiranje glavnog projekta Akumulacije 2 sufinancirano je sredstvima Ministarstva turizma i dovršeno je u prosincu 2015. te je predan zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole. Dozvola je ishođena tek u rujnu 2016. budući je uvjet za ishođenje građevinske dozvole riješeno vlasništvo odnosno uređeni imovinsko-pravni odnosi te je isto bilo moguće nakon što je DUUDI donio Odluku o pravu građenja za tu česticu.

U 2016. godini od strane ViK-a bila je planirana izrada dijela glavnih projekata i imovinsko-pravna priprema, ukupne procijenjene vrijednosti 6 milijuna kuna. Ugovor za projektiranje je potpisan u kolovozu 2016. te je do kraja godine realizirano 100.000 kn.

Još je potrebno obavljanje niza poslova (projektiranje, ishođenje građevinskih dozvola, imovinsko-pravna priprema) do realizacije izgradnje vodoopskrbe Platka, a sama gradnja vezana je uz rekonstrukciju vodovodnog sustava Grobinštine koja će se izvoditi paralelno uz izvođenje sustava odvodnje „Aglomeracije“ što će se vršiti kroz više godina; stoga će se po razradi projekta od strane ViK-a nastaviti daljnja suradnja i razmotriti pitanje potpisivanja novog Sporazuma.

## **1.2. PRIJEDLOG RASPOREDA SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO, REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK**

U Proračunu PGŽ je za projekt RSRTC Platak u 2017. godini planirano 4,75 milijuna kuna. Prijedlog Plana aktivnosti za 2017. godinu raspravljen je i usvojen na sastanku Projektnog tima održanom 23. prosinca 2016.

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

- postaviti ravni tubeing uz sanjkalište Radeševo
- postaviti caffè vidikovac na Vrh Radeševa
- urediti trim staze sa zonom sa spravama za vježbanje
- izraditi glavni projekt sustava zasnježenja skijališta Baby lift i Pribeniš
- ishoditi građevinske dozvole za sustav zasnježenja Radeševo i sustav Baby lift i Pribeniš
- nastaviti izradu glavnih projekata vodoopskrbe Platka dovodom vode iz Riječkog vodoopskrbnog sustava
- izraditi meteorološku analizu klimatskih uvjeta
- izraditi projekt elektroopskrbe za cijelu zonu za potrebe definiranja najpovoljnijeg načina elektroopskrbe
- rekonstruirati sljedeću dionicu prometnice Ž 5030 III faza do Platka dužine 1,2 km kroz Program ŽUC-a
- dopuniti ponudu „ljetnim sadržajima“: dječjeg igrališta – drvenog parka spretnosti i adrenalinskog parka,
- urediti krovništa i objekte drvenim poluobicama u gorskom stilu
- opremiti postojeće pješačke i biciklističke staze signalizacijom i klupicama
- urediti i međusobno povezati postojeće skijaške staze (turističku, Pribeniš, Tešnje),
- urediti staze za sanjkanje i nordijsko trčanje te nabaviti potrebne sanjke za uređenje
- dovršiti i usvojiti Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja SC Platak i
- provesti ostale potrebne poslove izrade dokumentacije i radova vezane uz uređenje, korištenje i upravljanje sadržajima unutar RSRTC Platka.

U sljedećem višegodišnjem razdoblju planira se nastavak realizacije dijela sadržaja Centra Platak koju bi financirala PGŽ i ostale zainteresirane strane u projektu iz vlastitih sredstava, ali i ostalih izvora prema raspoloživim natječajima.

Nastavit će se aktivnosti na pripremi dokumentacije, ali i dopune i poboljšanja postojećih objekata odnosno sadržaja. Prioritetni zadatak je i dovršiti imovinsko-pravne poslove kako bi se stekli uvjeti za građenje.

Nositelji aktivnosti su: GSC za uređenje sadržaja javne sportske i turističke infrastrukture, ŽUC za uređenje ceste Ž 5030 te VIK za daljnje projektiranje objekata sustava vodoopskrbe.

Kroz dosadašnje aktivnosti na projektu provedena je projektna i imovinsko-pravna priprema za gradnju jedinstvenog sustava zasnježenja skijaških staza. S obzirom na značaj i visinu investicije, u postupku pripreme su i službeni podaci DHMZ-a vezano za

meteorološke i klimatološke podatke. Po prikupljanju i analizi te ocjeni navedenih podataka moći će se utvrditi vjerojatnost i opravdanost ulaganja u sustav zasnježenja te tim i donijeti kvalitetna investicijska odluka. Podaci su u pripremi te će se po dovršetku utvrditi preduvjeti za pokretanje konkretne investicijske aktivnosti.

Kako u ovoj godini VIK očekuju poslovi projektiranja kao i imovinsko pravna priprema zemljišta, odnosno veća ulaganja, a odluka o sufinanciranju Hrvatskih voda do danas nije donesena, predloženo je Županu sufinanciranje ove aktivnosti kroz Projekt RSRTC Platak iz Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 300.000,00 kn.

Kako je već navedeno u Informaciji, prethodnih godina je uređeno 3,5 km ceste Ž5030 od parkirališta na Platku prema D3. Preostalih 5,2 km još nije sanirano i planira se u sljedećem višegodišnjem razdoblju po dionicama kako budu pripremljene za provedbu. Prometnica Ž 5030 je u današnjem stanju nesigurna za povećani obim prometa, s lošim stanjem kolnika, uskog profila odnosno nedovoljne širine profila posebno u zimskim uvjetima, s opasnim usjecima zbog odrona, bez proširenja za čišćenje snijega i bez dovoljnog broja propusta za oborinske vode. Stoga se i u 2017. godini predlaže sanacija nove dionice ceste u dužini od 1,2 km u planiranoj vrijednosti investicije od 3.000.000,00 kn. ŽUC će u vlastitom Planu osigurati 1.000.000,00 kn, dok se iz Županijskog proračuna predlaže sufinanciranje u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Temeljem članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu («Službene novine» broj 30/16), sredstva za projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktima Županijske skupštine. Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna. Kako je iznos u Proračunu za 2017. godinu za ovaj projekt veći, a samim Proračunom nije određen korisnik, Županijskoj skupštini predlaže se donošenje zaključka o rasporedu sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. u iznosu od 2.450.000,00 kn i Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2.000.000,00 kn.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU**

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u razdjelu 9 – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

### **4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Dana 6. ožujka 2017. godine Župan Primorsko-goranske županije prihvatio je Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu te

- utvrdio da su dovršeni radovi na pokretnim trakama Pribeniš, Radeševo i Baby lift i tubeingu Radeševo u sklopu projekta RSRTC Platak te kao takvi nisu predmet daljnjih investicija već će se sredstva za njihov rad osigurati u okviru redovnog poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o.
- rasporedio sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Razdjel 9 - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, korisniku KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka u iznosu od 300.000,00 kuna za izradu potrebne tehničke dokumentacije za objekte vodoopskrbe za potrebe RSRTC Platak.

Župan ujedno predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak i tekstu kako slijedi

Na temelju članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 30/16),, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

### **Z a k l j u č a k**

1. Prihvata se Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu.
2. Raspoređuju se novčana sredstava osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Razdjel 9-Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u ukupnom iznosu od 4.450.000,00 kuna, korisnicima kako slijedi:
  - Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice u iznosu od 2.450.000,00 kuna za realizaciju aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  - Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2.000.000,00 kuna za uređenje dionice ceste Ž 5030 III faza

KLASA: 021-04/16-01/1  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-6  
Rijeka, 25. veljače 2016.

Na temelju članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 –pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je

### **Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

2. Novčana sredstava osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 9-Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna, raspoređuju se korisnicima kako slijedi:

- Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice u iznosu od 4.000.000,00 kuna sa stavke 386 *Kapitalne pomoći* za realizaciju aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
- Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2.000.000,00 kuna sa stavke 363 *Pomoći unutar općeg proračuna* za rekonstrukciju dionice ceste Ž 5030

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**

**Dostaviti:**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  
n/r pročelnika **izv.prof.dr.sc. Ljudevita Krpana**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. Županu **Zlatku Komadini**
4. zamjenicima Župana, **svima**
